Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Dietesheimer Straße 70 | 63165 Mühlheim am Main
Telefon 06108 6005-0 | info@stadtwerke-muehlheim.de

Prüfprotokoll für den Messaufbau bei Kaskadenschaltung

Kunde

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenstandort


Straße, Nr.

PLZ, Ort

Flur

Flurstück

Gemarkung

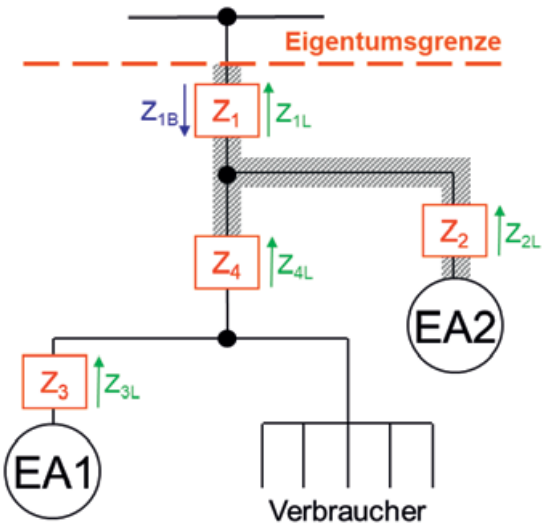

Z_1: Zähler für Bezug und Lieferung
Z_2, Z_3, Z_4: Zähler für Lieferung

Zählerbeschriftung wurde durchgeführt und auf Zuordnung nach dem Messkonzept B4 Kaskadenschaltung geprüft. ☐ ja
Im schraffierten Bereich sind keine Verbraucher angeschlossen!

2.) Anlagenzuordnung wurde geprüft: ☐ ja

EA1 = Energieträger Leistung

EA2 = Energieträger Leistung

3.) Prüfung der Messwerte:

a.) EA1 in Betrieb EA2 außer Betrieb ☐ ja

- Energiemenge der Erzeugung an Z2L bleibt unverändert ☐ ja
- Einspeiseenergiemenge an Z4L ist gleich groß wie an Z1L ☐ ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z3L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z4L ☐ ja

b.) EA1 außer Betrieb EA2 in Betrieb ☐ ja

- Energiemenge der Erzeugung an Z3L bleibt unverändert ☐ ja
- Energiemenge der Einspeisung an Z4L bleibt unverändert ☐ ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z2L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z1L ☐ ja

c.) EA1 und EA2 in Betrieb ☐ ja

- Energiemenge der Erzeugung an Z3L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z4L ☐ ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z2L ≥ Energiemenge der Einspeisung an (Z1L–Z4L) ☐ ja
- Energiemenge der Einspeisung an Z1L ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z4L ☐ ja

Sobald eine Prüfung nicht mit „Ja“ angekreuzt wurde, muss der Messaufbau nochmals geprüft werden.

Datum, Unterschrift Elektrofachfirma

Datum, Unterschrift Anlagenbetreiber
